

ING. JAN KRPATA, AQUA-TECHNIK

Projekty rozvodů vody, kanalizace, plynu a vytápění

ING. JAN KRPATA, AQUA - TECHNIK
Mladenovova 3230
143 00 Praha 4 – Modřany

p. www. tpa a.eu

MČ PRAHA 10

Vršovická 1429/68
101 38 Praha 10

Věc: ZŠ Švehlova 2900/12, Praha 10
Změnový list ZL 1 – souhlas

Datum: 18.8.2023

Vážení,

na základě vašeho požadavku vám zasílám stanovisko k předloženému změnovému listu ZL1 ze dne 15.08.2023, tj. předloženému rozpočtu „**ROZPOČET - SOUPIS PRACI KE ZMĚNOVEMU LISTU Č. 1**“ ZŠ Švehlova **na částku 649 915,78 Kč bez DPH.**

1. Soklové obklady - nová kancelář a stavbou dotčené kanceláře

V kancelářích je stávající PVC, u kterého jsou stávající soklové lišty nalepeny přes původní soklové obkladačky. Na KD bylo dohodnuto s vedením školy, že se soklové obkladačky odstraní, omítka začistí a k PVC podlaze se použije běžné lepení soklových lišt na omítku.

2. Oprava PVC a kobereců - nová kancelář a stavbou dotčené kanceláře

V projektu byla plánována oprava částí podlahové plochy ve dvou kancelářích dotčených stavbou (zazdění průchozích dveří). Rozsah poškození podlahové plochy byl větší. Na KD bylo dohodnuto s vedením školy o výměně podlahových krytin v těchto místnostech.

3. Truhlářské práce

Stavba zajistila demontáž, stěhování a montáž zařízení v prostorách 1.NP (šatny dětí).

4. Přesun hmot


Zvýšený přesun hmot při oddělení prostoru vstupu dětí a stavby.

5. Sádrokartonové zákryty

V 1.NP byly v důsledku změny trasy vodovodního potrubí (stávající výška podhledu těsně pod průvlaky neumožňovala vedení potrubí pod průvlaky) provedeny sádrokartonové zákryty nových tras.

ING. JAN KRATA, AQUA-TECHNIK

Projekty rozvodů vody, kanalizace, plynu a vytápění

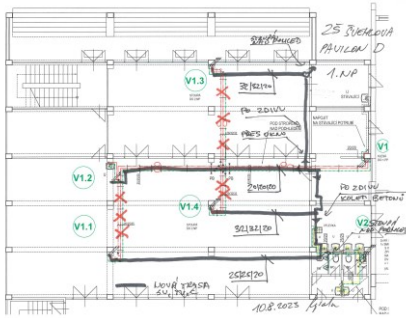

6. Přizdívky v umyvárnách

V projektu plánované „vyrovnání stěn“ se nedalo pod nové obklady použít a bylo přistoupeno k vytvoření rovných přizdivek.

Se změnovým listem ZL 1 v částce 649 915,78 Kč bez DPH bez DPH souhlasím.

V případě dotazů jsem vám k dispozici.

S pozdravem
Ing. Jan Krpata
