

Změnový list č. 17 (ZL)

ZL č./verze:	17
Datum předložení ZL:	25.11.2024
Smlouva o dílo (SoD) č.:	2022/OMP/0620
Ze dne:	22.04.2022
Stavba:	Rekonstrukce objektu č. p. 200 k.ú. Strašnice na základní školu Praha 10 – Strašnice
Název změny:	Střechy_VZT komínek

Důvod změny a identifikace původce změny:

Jedná se o svislé zaklopení a opláštění výustku VZT na střeše 4.NP přístavby. V rámci DPS a VV SoD byla pouze ocelová konstrukce.

Tento ZL doplňuje prvky svislého opláštění, a rohových profilů VZT výustku / komínku.

Popis změny:

'Přípočet položek opláštění VZT výustku.

Změna dle ZZVZ § 222, odstavec 5

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

02.1.5 - Střechy - bourání+nový stav
VON - VRN+ON

Přílohy:

ZL 17 Příloha č.01 - Vyčíslení změny,v01
ZL 17 Příloha č.02 - Půdorys 4.NP s vyznačením VZT výustku
ZL 17 Příloha č.03 - Fotodokumentace
ZL 17 Příloha č.04 - Skladba opláštění VZT výustku

Vyjádření projektanta ke změně (GP/AD):

Vyjádření dozoru ke změně (TDI/TDS):

Vyjádření objednatele ke změně (INV):

Časový dopad oproti původnímu řešení:	Bez dopadu	
	s dopadem:	0 dní
Orientační cenový dopad (bez DPH):	Odpočet:	- 0,00 Kč
	Přípočet:	137 644,10 Kč
	Celkem:	137 644,10 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Bc. Jakub Brzoň	9.12.24		
	Ing. Magda Nováková	9.12.24		
Za TDI:	Ing. René Poruba	5.12.24		
Za GP/AD:		9.12.24		
Za zhotovitele:		7.12.24		
		11.12.24		



Projekt:	Rekonstrukce objektu č. p. 200 k.ú. Strašnice na základní školu Praha 10 – Strašnice
Objednatel:	Městská část Praha 10
Zhotovitel:	„ZŠ Strašnice – OHLA ŽS & SYNER“
Název dokumentu:	Změnový list č. 17

Změnový list (ZL)

Změna vyvolaná / požadovaná: Zhotovitelem / Objednatelem	Číslo změnového listu: 17
Profese / konstrukce: Opláštění výustku VZT	Datum vydání: 25.11.2024
Stavební objekt: 02.1.5 - Střechy - bourání+nový stav VON - VRN+ON	Název změny: Střechy_VZT komínek

Popis změny:	Důvod změny a identifikace původce změny
Obecný popis změn položek: Přípočet položek opláštění VZT výustku.	Jedná se o svislé zaklopení a opláštění výustku VZT na střeše 4.NP přístavby. V rámci DPS a VV SoD byla pouze ocelová konstrukce. Tento ZL doplňuje prvky svislého opláštění, a rohových profilů VZT výustku / komínku.

Odpočet - Kč
Přípočet 137 644,10 Kč

Cena změny celkem (bez DPH): 137 644,10 Kč
Dopady do HMG: NE Popis: 0 dní

SCHVÁLENÍ ZMĚNY K REALIZACI

Podpis zástupce ZHOTOVITELE:	Podpis zástupce OBJEDNATELE:
Datum a podpis: 5.12.24	Datum a podpis: 9.12.24 Bc. Jakub Brzoň
Datum a podpis: 5.12.24	Datum a podpis: 9.12.24 Ing. Magda Nová
Podpis zástupce GP/AD:	Podpis zástupce TDI:
Datum a podpis: 5.12.24	Datum a podpis: 5.12.24 Ing. René Poruba

Přílohy:

ZL 17 Příloha č.01 - Vyčíslení změny,v01

ZL 17 Příloha č.02 - Půdorys 4.NP s vyznačením VZT výstku

ZL 17 Příloha č.03 - Fotodokumentace

ZL 17 Příloha č.04 - Skladba opláštění VZT výstku

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu č. p. 200 k ú. Strašnice na základní školu Praha 10 – Strašnice
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: **17 Střechy_VZT komínek**
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 25.11.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	137 644,10
PSV - Práce a dodávky PSV	128 331,42
712 - Powlakové krytiny	105 829,51
713 - Izolace tepelné	7 780,87
762 - Konstrukce tesařské	14 721,04
VRN - Vedlejší a ostatní náklady	9 312,68
VRN3 - Zařízení staveniště	2 829,86
VRN4 - Inženýrská činnost	5 617,27
VRN9 - Ostatní náklady	865,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu č. p. 200 k.ú. Strašnice na základní školu Praha 10 – Strašnice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

17 Střechy_VZT komínek

Místo:

Datum: 25.11.2024

Zadavatel:

Projektant:


Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							137 644,10	
D	PSV	Práce a dodávky PSV					128 331,42	
D	712	Povlakové krytiny					105 829,51	
17_1	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	24,800	15,30	379,44	CS URS 2024 II
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712861703					
		VV	Opláštění výustku VZT		24,800			
53	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,007	64 364,54	450,55	SoD 02.1.1
		P	Poznámka k položce					
		VV	Spotřeba 0,3-0,4kg/m2		0,007			
17_2	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepicí asfaltový pás	m2	24,800	48,60	1 205,28	CS URS 2024 II
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712861703					
		VV	Opláštění výustku VZT		24,800			
		VV	24,8					
17_3	M	62866281	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny spalitelnou folii nebo jemnozrným minerálním posypem tl.3,0 mm	m2	24,800	241,00	5 976,80	CS URS 2024 II
		VV	24,8		24,800			
17_4	K	712363121	Provedení povlakové krytiny střech do 10° provedení rohů a koutů nalepením izolačních tvarovek	kus	12,000	49,40	592,80	CS URS 2024 II
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712861703					
		VV	rohové tvarovky pro montáž folie		12,000			
17_2	M	28322070	roh vnitřní pro střešní folie mPVC šedé	kus	12,000	71,60	859,20	CS URS 2024 II
		VV	rohové tvarovky pro montáž folie		12,000			
		VV	12					
13	K	712361703	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií přilepenou v plné ploše	m2	24,800	412,88	10 239,42	SoD 02.1.5
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712361703					
		VV	Folie stěn a zastřešení nástavby VZT výustku		24,800			
		VV	24,8					
17_3	K	712861703	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií přilepenou v plné ploše	m2	68,628	338,00	23 196,26	CS URS 2024 II
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712861703					
		VV	Vytažení folie na zhlaví atiky		68,628			
		VV	81,70*(0,2+0,64)					
17_4	K	712363120	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů hranatého průřezu pl přes 0,25 do 0,75 m2	m2	3,000	338,00	1 014,00	CS URS 2024 II
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712861703					
		VV	Zaizolování prostupu výustků 4 ks		3,000			
		VV	4*0,75					
14	M	28322012	folie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá	m2	110,892	471,86	52 325,50	SoD 02.1.5
		VV	24,8		24,800			
		VV	81,70*(0,2+0,64)		68,628			
		VV	4*0,75		3,000			
		VV	Součet		96,428			
		VV	96,428*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		110,892			
15	K	712391171	Provedení podkladní textilní vrstvy	m2	24,800	73,73	1 828,50	SoD 02.1.5
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712391171					
		VV	skladba stěn a zastřešení VZT výustku		24,800			
		VV	24,8					
16	M	6931102R	geotextilie netkaná separační, bílá sklovláknitá (separační sklovláknitý vlies)	m2	28,520	125,34	3 574,70	SoD 02.1.5
		VV	24,8*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		28,520			
17_5	K	712399097	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 NAIP, foliemi nebo termoplasty	m2	3,000	38,90	116,70	CS URS 2024 II
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712861703					
		VV	Zaizolování prostupu výustků 4 ks		3,000			
		VV	4*0,75					
17	K	998712204	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 36 m	%	4,00	1 017,59	4 070,36	SoD 02.1.5
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_201_02/998712204					
D	713	Izolace tepelné					7 780,87	
17_6	K	713141131	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá zplna	m2	24,800	173,00	4 290,40	CS URS 2024 II
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_20254_02/713141131					
		VV	TI stěn a zastřešení VZT výustku		24,800			
		VV	24,8					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17_7	M	28372305	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl.50 mm	m2	26,040	125,34	3 263,85	CS URS 2024 II
VV			24,8*1,05 Přepočtené koeficientem množství		26,040			
23	K	998713204	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m	%	3,00	75,54	226,62	SoD 02.1.5
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998713204					
D		762	Konstrukce tesařské				14 721,04	
17_6	K	762341036	Bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na rošt na sraz, tloušťky desky 22 mm	m2	24,800	560,00	13 888,00	CS URS 2024 II
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762341036					
VV			Opláštění VZT nástavby OOSB deskami tl.22mm kotvenými do ocelové konstrukce+					
VV			24,8		24,800			
54	K	998762104	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 24 do 36 m	%	0,356	2 340,00	833,04	CS URS 2024 II
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998762104					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	VRN		Vedlejší a ostatní náklady				9 312,68	
D	VRN3		Zařízení staveniště				2 829,86	
7	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	Kč	1,000	2 829,86	2 829,86	SoD
VV			veškeré náklady zařízení staveniště a provozu při výstavbě					
VV			1,0		1,000			
VV			Součet		1,000			
D	VRN4		Inženýrská činnost				5 617,27	
9	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	5 617,27	5 617,27	SoD
P			Poznámka k položce: inženýrská činnost dodavatele včetně zajištění všech dokladů pro koordinaci stavby, plán BOZP na staveništi, plán a harmonogram výstavby					
D	VRN9		Ostatní náklady				865,55	
13	K	09100300	Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení	Kč	1,000	865,55	865,55	SoD
P			Poznámka k položce: Například náklady související s pracemi na památkovém objektu - účast restaurátorů a specialistů na stavbě, koordinace prací					

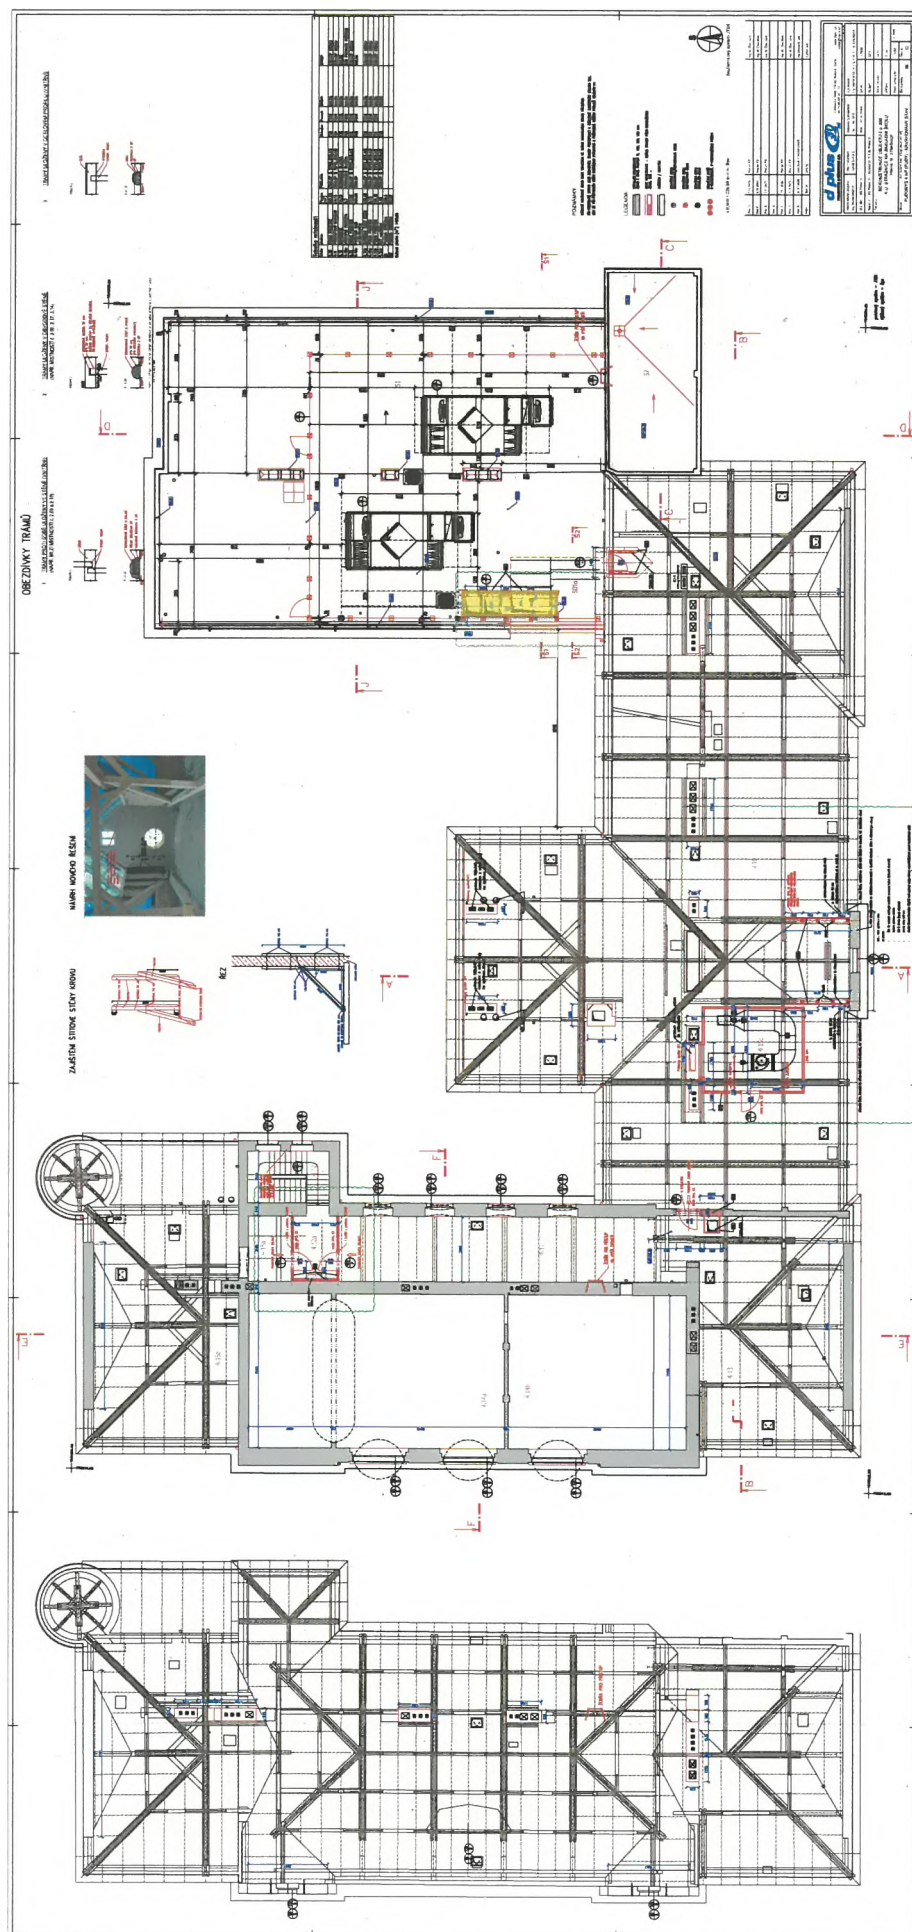







ČEZ + SKLAD BA VZT KOTÍPKU

+242.300

— HYDROIZOLAČNÍ FOLIE TL. 1,5 mm
— SEPARAČNÍ VRSTVA
— ROVNÉ DESKY EPS 50 mm
— PAROTĚSNÝ PÁS
— PENETRACE
— OSB 3, TL. 22 mm
— OCELOVÁ KONSTRUKCE

— HYDROIZOLAČNÍ FOLIE TL. 1,5 mm
— SEPARAČNÍ VRSTVA
— ROVNÉ DESKY EPS 50 mm
— PAROTĚSNÝ PÁS
— PENETRACE
— OSB 3, TL. 18 mm
— OCELOVÁ KONSTRUKCE

SLOUPEK JÄCKEL
70/70/5 DL.1850

