

ING. JAN KRPATA, AQUA-TECHNIK

Projekty rozvodů vody, kanalizace, plynu a vytápění

ING. JAN KRPATA, AQUA - TECHNIK
Mladenovova 3230
143 00 Praha 4 – Modřany

p. www. tpa a.eu

MČ PRAHA 10

Vršovická 1429/68
101 38 Praha 10

Věc: ZŠ Švehlova 2900/12, Praha 10
Změnový list ZL 2 – souhlas

Datum: 26.9.2023

Vážení,

na základě vašeho požadavku vám zasílám stanovisko k předloženému změnovému listu ZL2 ze dne 121.09.2023, tj. předloženému rozpočtu „**ROZPOČET - SOUPIS PRACI KE ZMĚNOVEMU LISTU Č. 2**“ ZŠ Švehlova **na částku 148 316,60 Kč bez DPH.**

1. Nátěry otopných těles ve 2.NP


V opravovaných kancelářích (zazděny průchody, odstraněny soklové lišty, výměna podlahovin) a budou zároveň natřena stávající otopná tělesa a provedena oprava jejich upevnění.

2. Úprava ZTI a ÚT a v 1.NP a ve 2.NP

- trasy ležatého vodovodního potrubí

Navržené trasy nelze dodržet, protože stávající úroveň podhledu je těsně (asi 1 cm) pod průvlakem, tj. v mezeře nelze potrubí vést. Nově navržené trasy jsou navrženy tak, aby nebyl nutný zásah do nosných konstrukcí (vrtání otvorů) a s ní spojené úpravy (statické zpevnění).

Stávající a nové trasy :

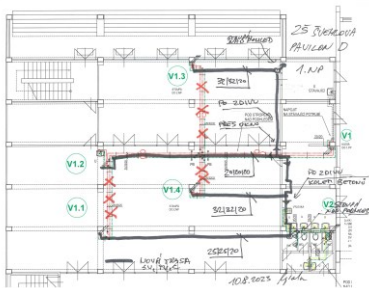

- vadné větrací kanalizační potrubí

Po odkrytí přizdívek bylo nalezeno vadné větrací potrubí, které obvykle bývá v bez závad a v PD bylo navrženo ponechat původní.

- úprava přizdívek v umyvárnách

Jedná se o vyzdění soklu do výšky 1500mm pro montáž modulů podomítkových baterií a vytvoření polic na mycí prostředky.

ING. JAN KRPATA, AQUA-TECHNIK

Projekty rozvodů vody, kanalizace, plynu a vytápění

Se změnovým listem ZL 1 v částce 148 316,60 Kč bez DPH bez DPH souhlasím.

S pozdravem

Ing. Jan Krpata
